


IXAS-werkschema

Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:




Avondwerkzaamheden

Sinds maart 2017 werkt IXAS in tweeploegendiensten. Dit betekent dat er ook in de avond gewerkt wordt. Het is een maatregel om te voorkomen dat er vertraging optreedt. Met dit [bouwbericht](#) informeerden we u over deze maatregel.

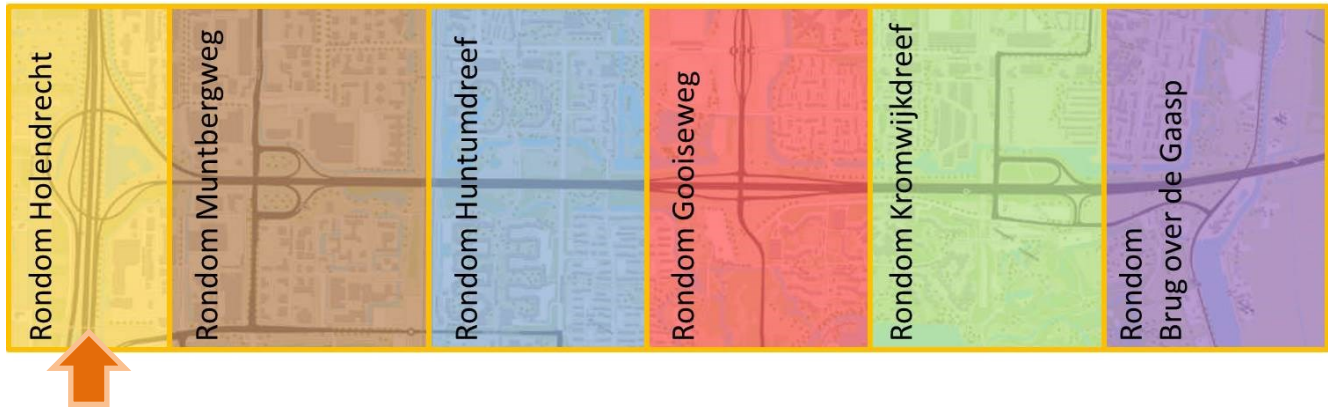


Rondon knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
4 tot en met 7 september	Nachtwerkzaamheden 23:00 – 5:00 uur	o.a. plaatsen geleiderail, verwijderen barriers	Geluidshinder, licht	
8 tot en met 11 september	Weekendwerkzaamheden Vrijdag 8 september 22:00 uur tot maandag 11 september 5:00 uur	Asfalteren verbindingsboog A2 richting Utrecht naar A9 richting Almere/Diemen	Geluidshinder, lichthinder en afsluiting verbindingsweg A2 richting Utrecht naar A9 richting Haarlem/Schiphol en A9 richting Almere/Diemen	Bouwbericht
22 tot en met 24 september	Weekendwerkzaamheden Vrijdag 22 september 23:59 tot zondag 24 september 12:00 uur	Maken voegen verbindingsboog A2 richting Utrecht naar A9 richting Almere/Diemen	Geluidshinder, lichthinder en afsluiting verbindingsboog van A2 richting Utrecht naar A9 richting Almere/Diemen	Bouwbericht

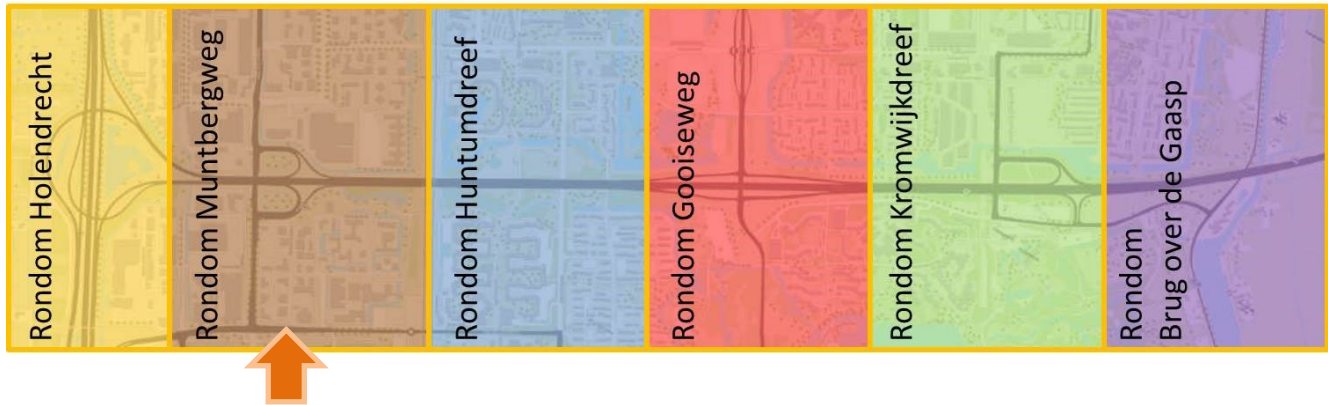


Rondon Muntbergweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
tot eind 2017	Gehele periode	Bouwen uitbreiding viaduct A9 over Muntbergweg	Versmalling Muntbergweg in noordelijke richting t.h.v. A9	Lees hier het bouwbericht
11 t/m 15 en 18 t/m 22 september	Tussen 9:00 en 15:30 uur	Afbouwwerkzaamheden A9-viaduct	Versmalling Muntbergweg t.h.v. A9. In beide rijrichtingen is 1 rijstrook beschikbaar.	Lees hier het bouwbericht

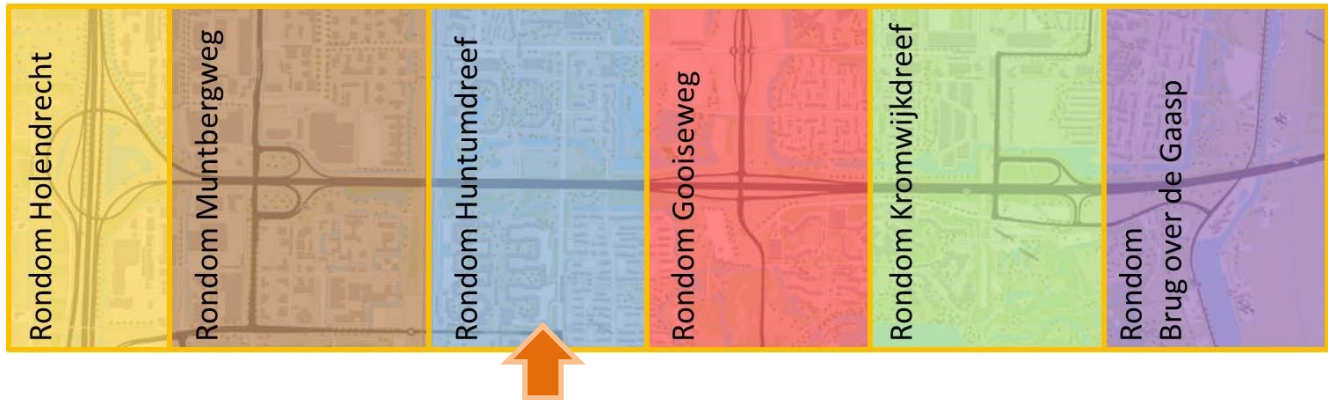

Rondom Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Vanaf woensdag 17 augustus 2016 tot einde project	Doordeweeks 7.00 – 19.00 uur. Soms ook op zaterdag	Grondwerk voor aanleg talud en gronddepot onder toekomstige fietsbrug Nelson Mandelapark	Voetpad afgesloten	Lees hier het bouwbericht
6 juni tot en met uiterlijk 1 december	Gehele periode	Bouw tunnel onder Bijlmerpleinpad	Bijlmerpleinpad afgesloten	Lees hier het bouwbericht

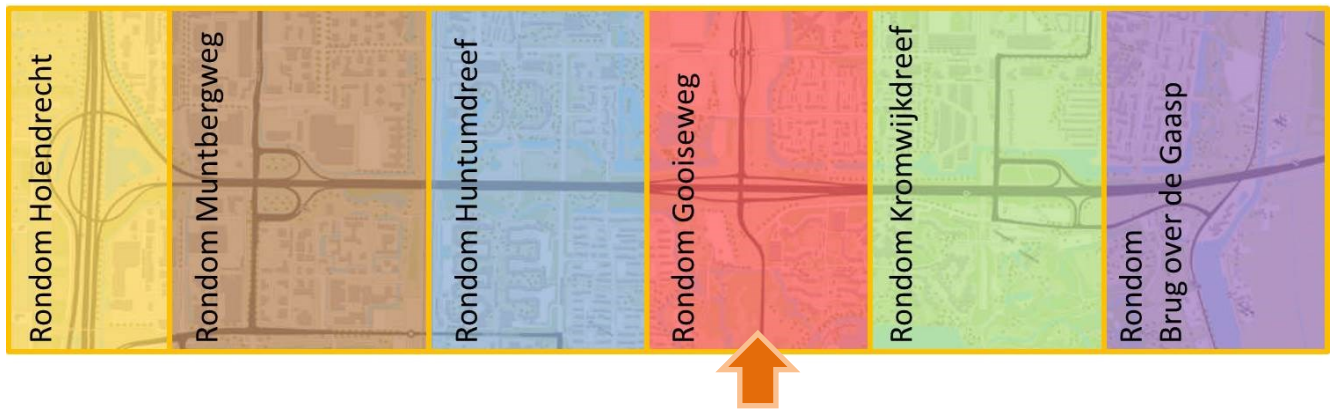

Rondon Gooiseweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
16 – 18 september RESERVEDATA: 23 – 25 september	WEEKENDWERK Zaterdag 16 september 6:00 uur tot maandag 18 september 5:00 uur	Steunpunten hulpbrug verplaatsen	Geluidsoverlast, lichtoverlast Afsluiting Gooiseweg ter hoogte van Gaasperdammertunnel (op- en afritten beschikbaar)	Bouwbericht



Rondon Kromwijkdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding



Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Tot en met 5 oktober Elke maandag en donderdag	10:00 – 5:00 uur	Afsluiting afrit 1, S113 Kromwijdreef van A9 uit de richting van Diemen	Omleiding via S112 Gooiseweg	
Maandag 18 tot en met vrijdag 22 september	7:00 – 19:00 uur	Verwijderen damwanden bij brug over de Gaasp	Geluids- en trillingshinder	Bouwbericht
Vrijdag 6 oktober tot en met maandag 16 oktober	6 oktober 22:00 uur tot 16 oktober 5:00 uur	Afsluiting afrit 1, S113 Kromwijdreef van A9 uit de richting van Diemen	Omleiding via S112 Gooiseweg	
