

6 oktober 2016

IXAS-werkschema


Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:



Heien op zaterdagen


Nu de bouw van de tunnel gestart is, werkt IXAS dag en nacht. Funderingswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van de 8.000 heipalen voor de tunnel, doen we zoveel als mogelijk van maandag tot en met vrijdag. IXAS zal de komende periode ook op zaterdagen heien. Dit gebeurt alleen bij de heistellingen die achterliggen op planning. De heistellingen die op planning liggen, staan op zaterdag stil. Om de hinder voor de omgeving te verkleinen, starten we op zaterdagen om 8.00 uur in plaats van om 7.00 uur. De heiers werken door tot de achterstand ingelopen is. Ze zullen vaak in de loop van de middag klaar zijn, maar mogelijk soms ook pas om 19.00 uur.

Aanstaande zaterdag 8 oktober worden geen heierwerkzaamheden uitgevoerd.

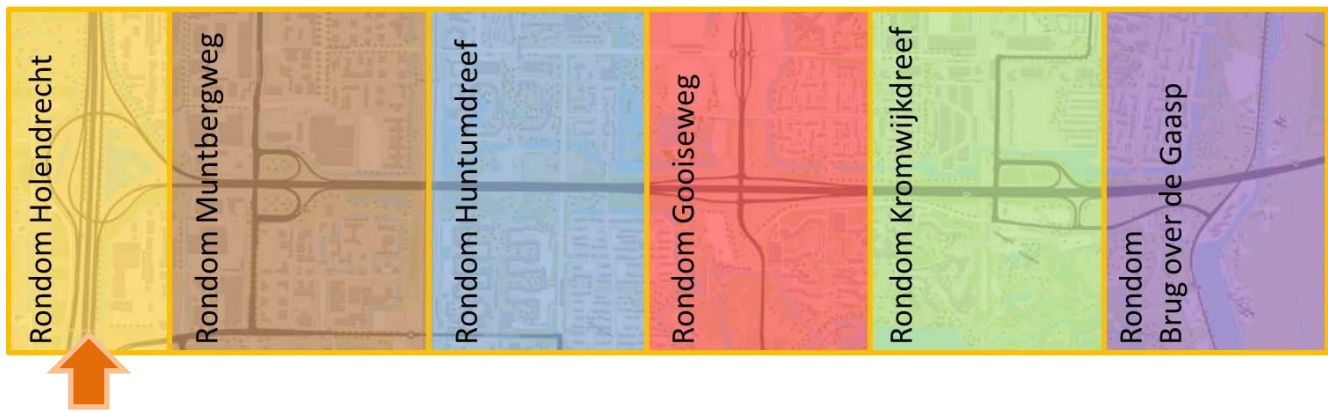


Rondon Knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
23 mei tot eind van het jaar	Maandag - vrijdag 22.00 – 5.00 uur	Aanbrengen kabels en leidingen	Geluid van kleine graafmachines	Lees hier het bouwbericht
Tot eind oktober	Maandag – vrijdag 7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen meest oostelijke ondersteuningsas noordelijke fly-over.	Geluids- en trillingshinder	Lees hier het bouwbericht

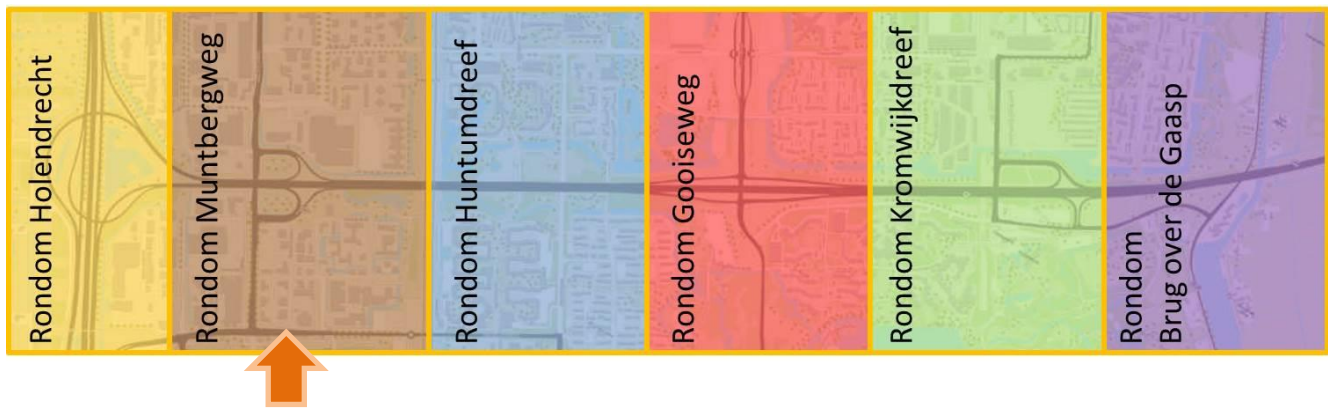

Rondom Muntbergweg


Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Maandag 18 april tot het einde van het jaar	Gehele periode	Bouwen middensteunpunt uitbreiding viaduct A9 over Muntbergweg	Versmalling Muntbergweg in noordelijke richting t.h.v. A9: 1 rijstrook voor rechtdoor en 1 rijstrook voor rechtsaf beschikbaar.	Lees hier het bouwbericht
25 april tot en met oktober	Gehele periode	Verleggen kabels en leidingen in het Lemelerbergpad en herstellen fietspad	Fietspad afgesloten tot medio oktober, omleiding via Muntbergweg	Lees hier het bouwbericht
29 september tot en met 4 oktober (werkzaamheden lopen uit)	Maandag tot en met vrijdag 7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen landhoofd viaduct Muntbergweg	Geluids- en trillingshinder	Lees hier het bouwbericht
Maandag 3 tot en met vrijdag 14 oktober	Maandag tot en met vrijdag 7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen landhoofden viaduct Haarlerbergpad	Geluids- en trillingshinder	Lees hier het bouwbericht
Vrijdag 21 tot maandag 24 oktober	Dag en nacht	Verplaatsen wisselbaan naar definitieve locatie. Veel asfalteren en frezen	Geluidshinder en veel verlichting	Lees hier het bouwbericht

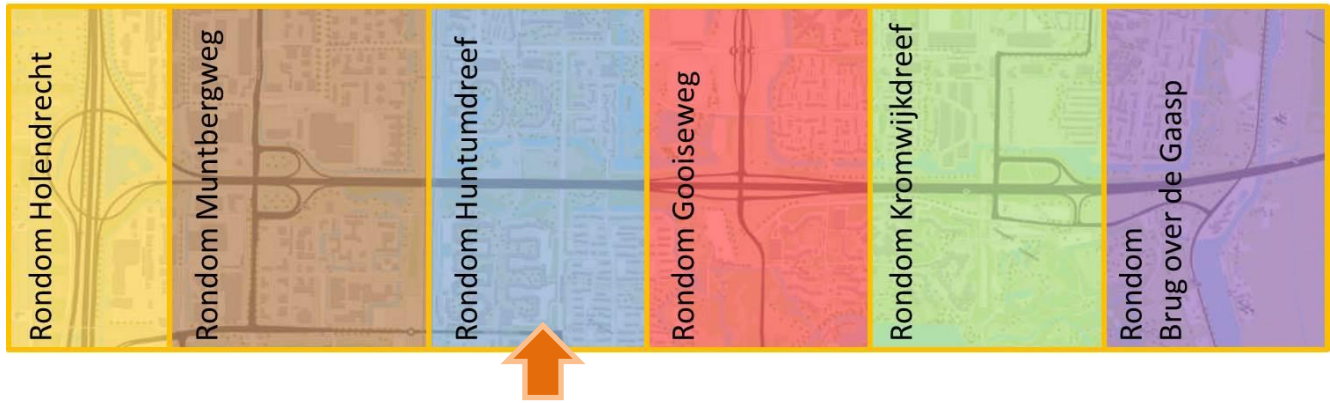

Rondon Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Begin juni t/m december 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Vanaf woensdag 17 augustus tot einde project	Doordeweeks 7.00 – 19.00 uur. Soms ook op zaterdag	Grondwerk voor aanleg talud en gronddepot onder toekomstige fietsbrug Nelson Mandelapark	Voetpad afgesloten	Lees hier het bouwbericht
Vrijdag 21 tot maandag 24 oktober	Dag en nacht	Verplaatsen wisselbaan naar definitieve locatie. Veel asfalteren en frezen	Geluidshinder en veel verlichting	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016)

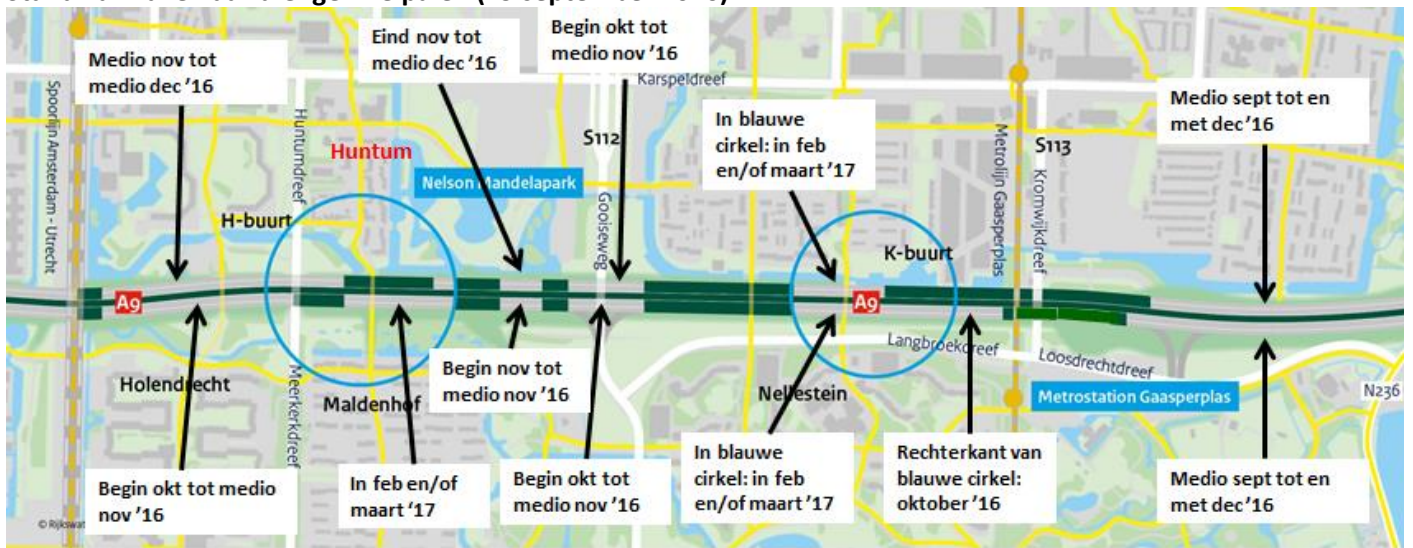


Heipalen en damwanden

■ Heipalen geplaatst

■ Nog te heien


○ Werkzaamheden damwanden

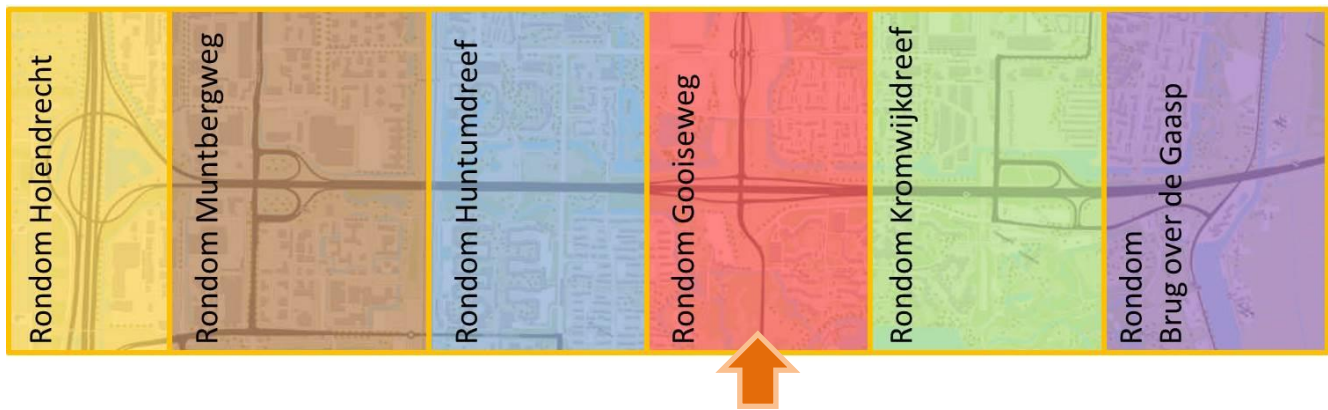

Rondon Goiseweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Begin juni t/m november 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Van eind september tot medio november	Doordeweeks van 6.00 – 23.00 uur en zaterdags van 7.00 – 19.00 uur	Betonstaalvlechten ter hoogte van de op- en afrit S112 Goiseweg.	In de donkere uren is er verlichting.	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016)

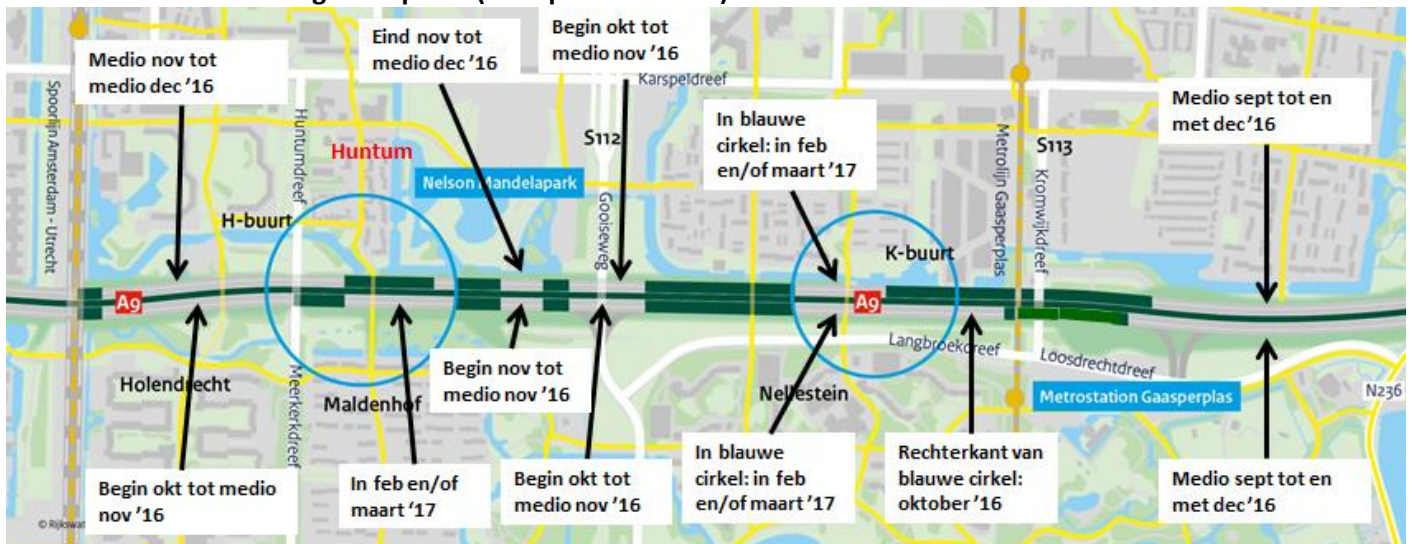


Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst

Nog te heien


Werkzaamheden damwanden

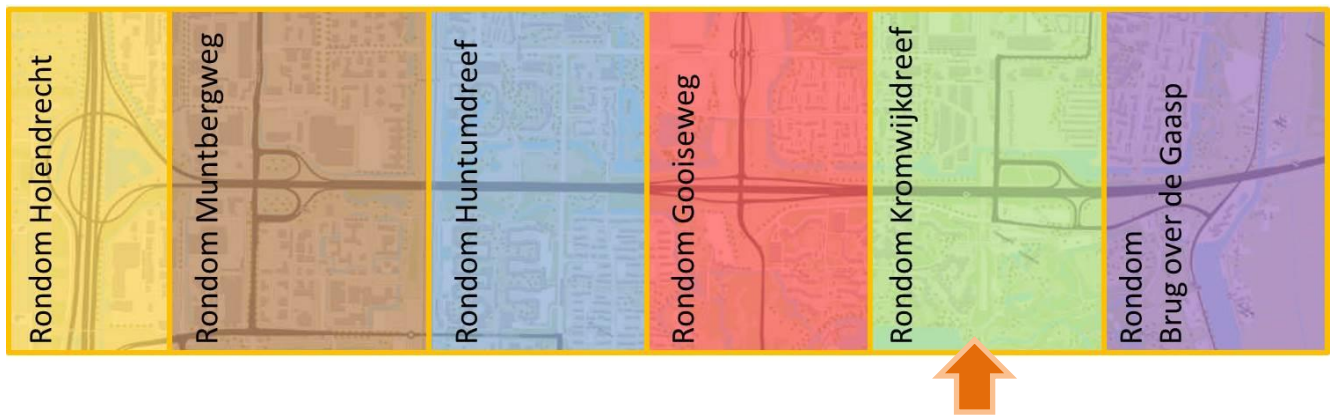

Rondon Kromwijdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Eind juli t/m november 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016)

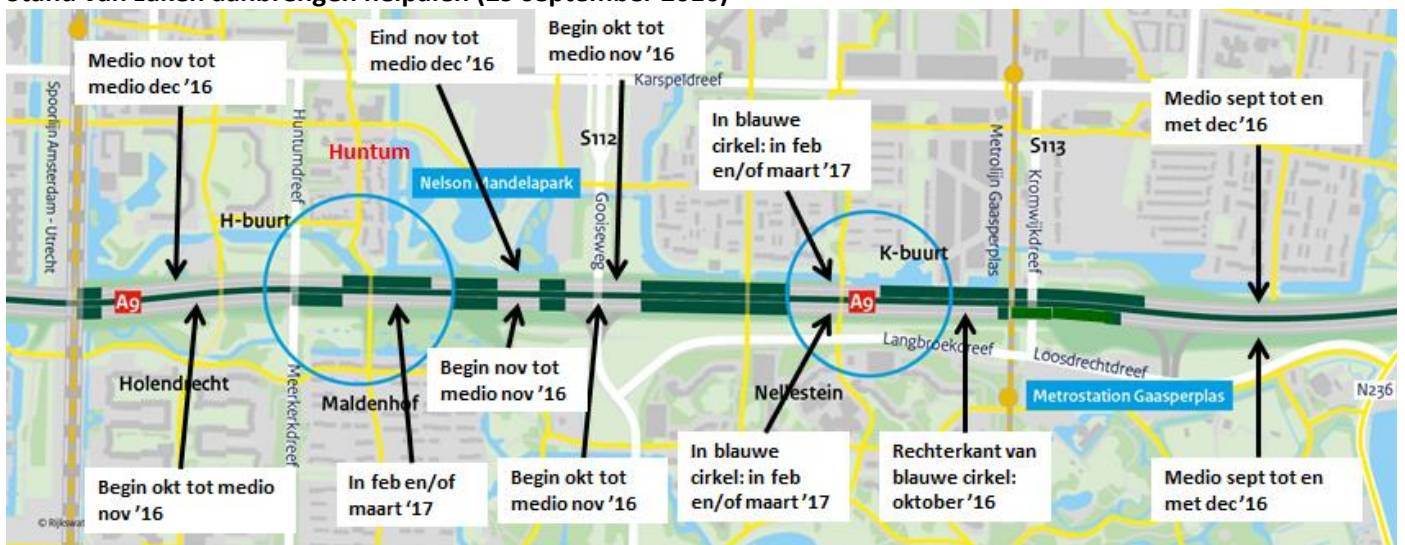


Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst

Nog te heien


Werkzaamheden damwanden

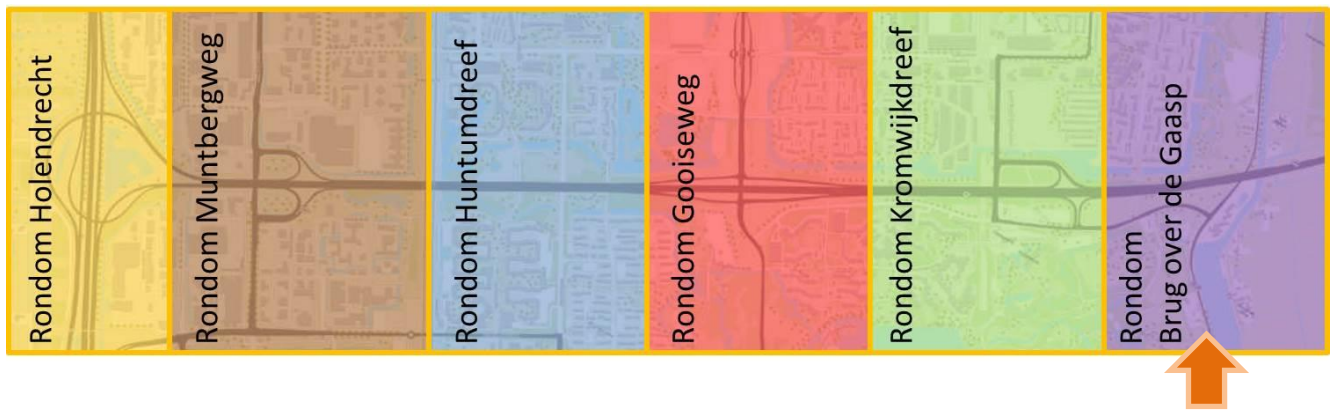

Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Eind juli t/m november 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
5 september – half oktober	Ma tot en met vrijdag 7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor tweede brug over de Gaasp aan de westkant van de rivier de Gaasp	Geluid- en trillingshinder	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (29 september 2016)

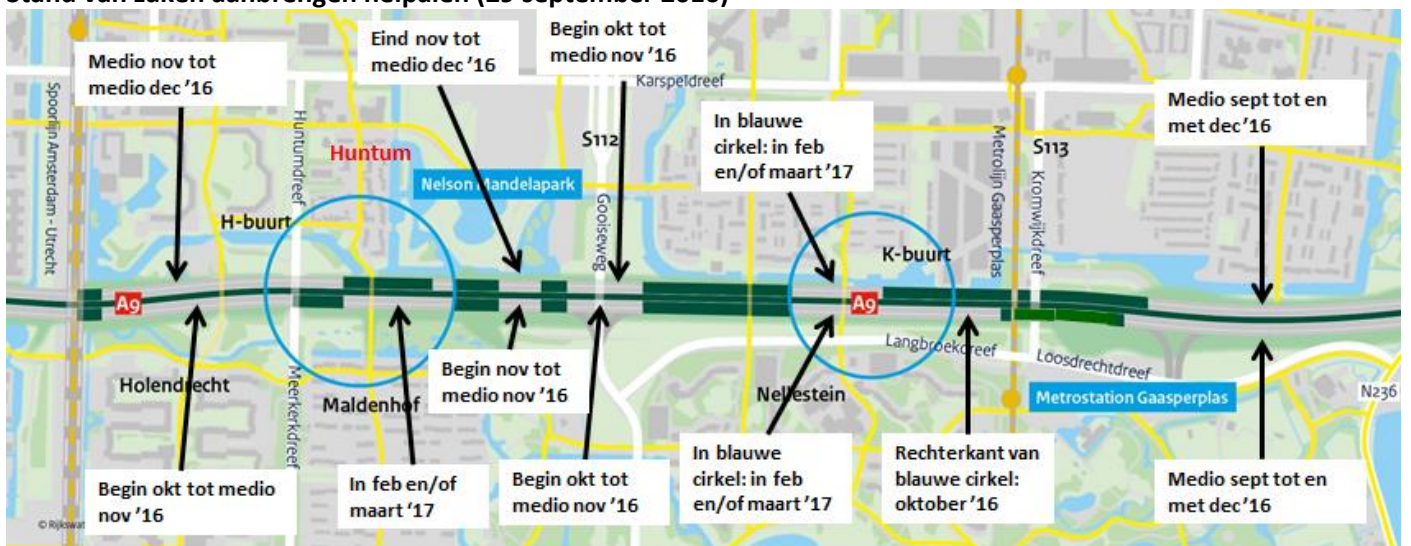

Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst

Nog te heien

Werkzaamheden damwanden
