

14 november 2016

IXAS-werkschema

Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:



Heien op zaterdagen


Nu de bouw van de tunnel gestart is, werkt IXAS dag en nacht. Funderingswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van de 8.000 heipalen voor de tunnel, doen we zoveel als mogelijk van maandag tot en met vrijdag. IXAS zal de komende periode ook op zaterdagen heien. Dit gebeurt alleen bij de heistellingen die achterliggen op planning. De heistellingen die op planning liggen, staan op zaterdag stil. Om de hinder voor de omgeving te verkleinen, starten we op zaterdagen om 8.00 uur in plaats van om 7.00 uur. De heiers werken door tot de achterstand ingelopen is. Ze zullen vaak in de loop van de middag klaar zijn, maar mogelijk soms ook pas om 19.00 uur.

Zaterdag 26 november en mogelijk zaterdag 10 december voeren we heiwerkzaamheden uit tussen het Geerdinkhofpad en de Brug over de Gaasp. We werken deze dagen tussen 8:00 en 18:00 uur.




Rondom Knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
23 mei tot eind van het jaar	Maandag – vrijdag 22.00 – 5.00 uur	Aanbrengen kabels en leidingen	Geluid van kleine graafmachines	Lees hier het bouwbericht
31 oktober t/m 11 november	Maandag tot en met vrijdag, overdag tussen 7.00 uur t/m 16.00 uur	Afbouwen Middenweg en Groeneveldweg	Afsluitingen delen Middenweg en Groeneveldweg	Zie hier de omleidingsroutes
Maandag 14 tot en met donderdag 24 november	Nachtwerkzaamheden 22:00 – 5:00 uur	Vorbereiden inhijsen liggers voor nieuwe wegdek. Onder andere geleiderail verwijderen en gaten boren	Geluidsoverlast Afsluitingen rijbanen A2	Info over afsluitingen: vananaarbeter.nl
Maandag 21 tot en met woensdag 30 november	Maandag – woensdag 7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen damwanden en heipalen ondersteuningsas voor nieuwe fly-over	Geluids- en trillingshinder	
Vrijdag 25 november tot maandag 28 november	Weekendwerkzaamheden van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 5:00 uur	Inhijsen liggers nieuwe viaducten en fly-overs knooppunt Holendrecht	Geluidsoverlast, Afsluitingen rijbanen A2	Info over afsluitingen: vananaarbeter.nl
Maandag 5 tot en met vrijdag 9 december	Nachtwerkzaamheden Maandag – vrijdag 22.00 – 5.00 uur	Aanbrengen heipalen voor portalen over A2	Geluids- en trillingshinder	

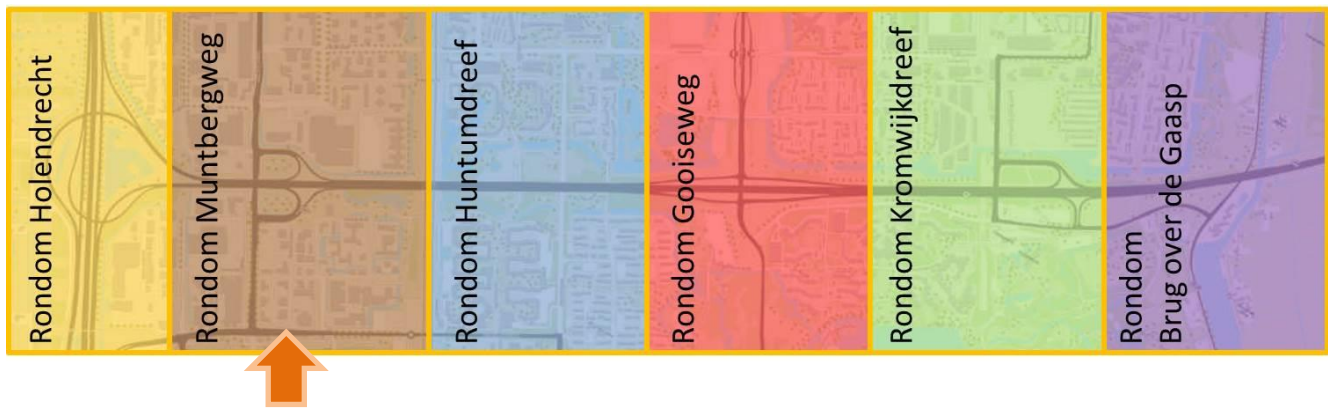

Rondon Muntbergweg


Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Maandag 18 april tot het einde van het jaar	Gehele periode	Bouwen middensteunpunt uitbreiding viaduct A9 over Muntbergweg	Versmalling Muntbergweg in noordelijke richting t.h.v. A9: 1 rijstrook voor rechtdoor en 1 rijstrook voor rechtsaf beschikbaar.	Lees hier het bouwbericht

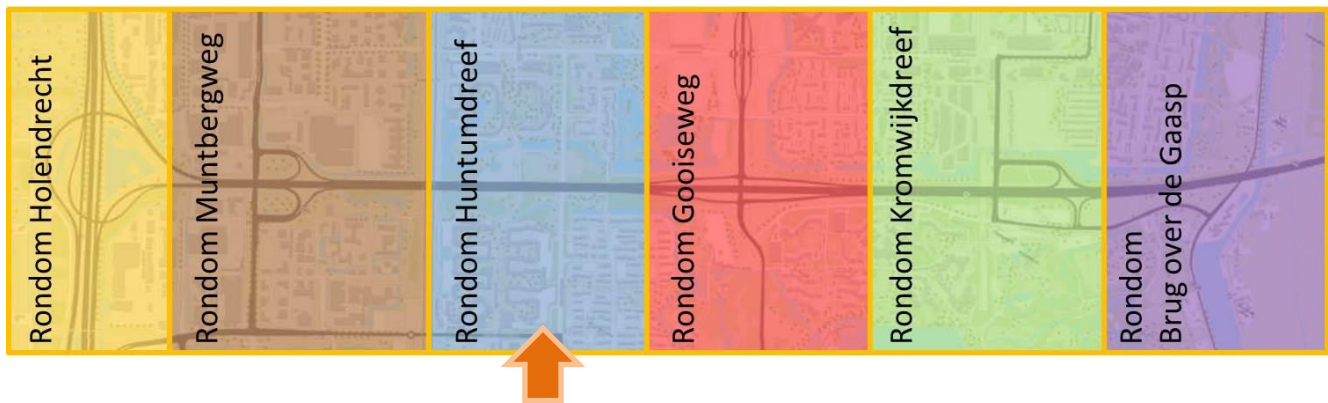

Rondon Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Begin juni t/m december 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Vanaf woensdag 17 augustus tot einde project	Doordeweeks 7.00 – 19.00 uur. Soms ook op zaterdag	Grondwerk voor aanleg talud en gronddepot onder toekomstige fietsbrug Nelson Mandelapark	Voetpad afgesloten	Lees hier het bouwbericht
Maandag 14 nov en dinsdag 15 nov	NACHTWERK 23:00-02:00 uur	Asfalt frezen ter hogge van de oprit S112 Goiseweg	Geluidshinder	nvt
Feb en maart 2017 (precieze weken nog niet duidelijk)	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016)

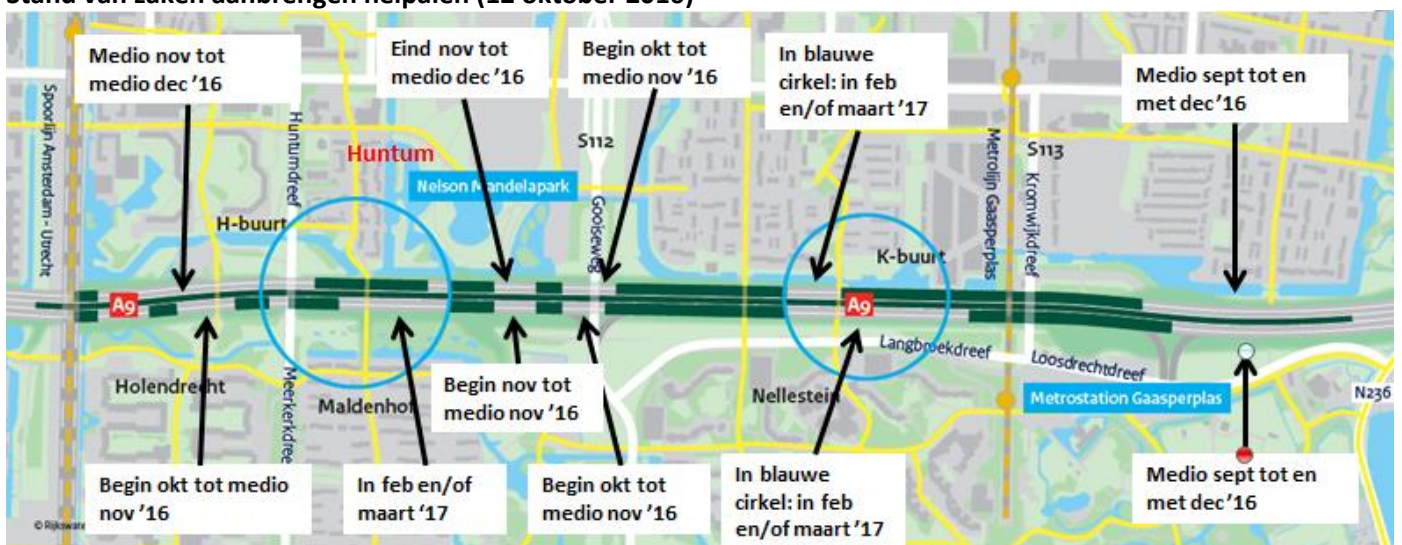


Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst

Nog te heien

Werkzaamheden damwanden

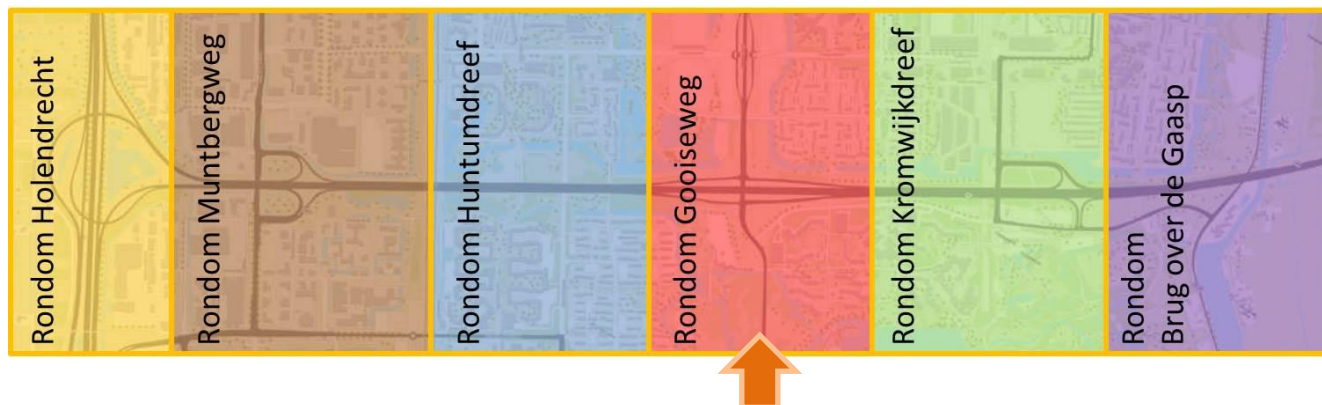



Rondon Gooiseweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Begin juni t/m medio december 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Van eind september tot medio november	Doordeweeks van 6.00 – 23.00 uur en zaterdags van 7.00 – 19.00 uur	Betonstaalvlechten ter hoogte van de op- en afrit S112 Gooiseweg.	In de donkere uren is er verlichting.	Lees hier het bouwbericht
Maandag 14 nov en dinsdag 15 nov	NACHTWERK 23:00 – 02:00 uur	Asfalt frezen ter hoogte van de oprit S112 Gooiseweg en ter hoogte van de afrit S112	Geluidshinder	nvt
Woensdag 23 nov en donderdag 24 nov	NACHTWERK 23:00 – 5:00 uur	Mantelbuis installeren op hulpbrug Gooiseweg	Enige geluidshinder	nvt
Vrijdag 25 november tot en met maandag 28 november	Vrijdagavond 22:00 uur t/m maandagochtend 5:00 uur	Start herinrichting kruispunt Gooiseweg (frezen, asfalteren, verwijderen verkeersborden en verkeerslichten)	- Nachtwerkzaamheden - Geluidshinder en verlichting van de bouwplaats - Afsluiting Gooiseweg en alle op- en afritten	Lees hier het bouwbericht
Vrijdag 9 december tot en met maandag 12 december	Vrijdagavond 22:00 uur t/m maandagochtend 5:00 uur	Herinrichting kruispunt Gooiseweg (frezen, asfalteren, belijning aanbrengen, borden plaatsen)	- Nachtwerkzaamheden - Geluidshinder en verlichting van de bouwplaats - Afsluiting Gooiseweg en alle op- en afritten	Lees hier het bouwbericht
Vrijdag 16 december tot en met woensdag 21 december	Vrijdagavond 22:00 uur t/m woensdagochtend 5:00 uur	Maken nieuwe aansluitingen op- en afrit Gooiseweg op de A9 (frezen, asfalteren, geleiderail plaatsen)	- Nachtwerkzaamheden - Geluidshinder en verlichting van de bouwplaats - Afsluiting afrit S112 Gooiseweg A9 ri. Utrecht/Haarlem tot 19	Lees hier het bouwbericht

			december 5:00 uur - Afsluiting toerit S112 Gooiseweg A9 ri. Utrecht/Haarlem tot 21 december 5:00 uur
--	--	--	--

Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016)

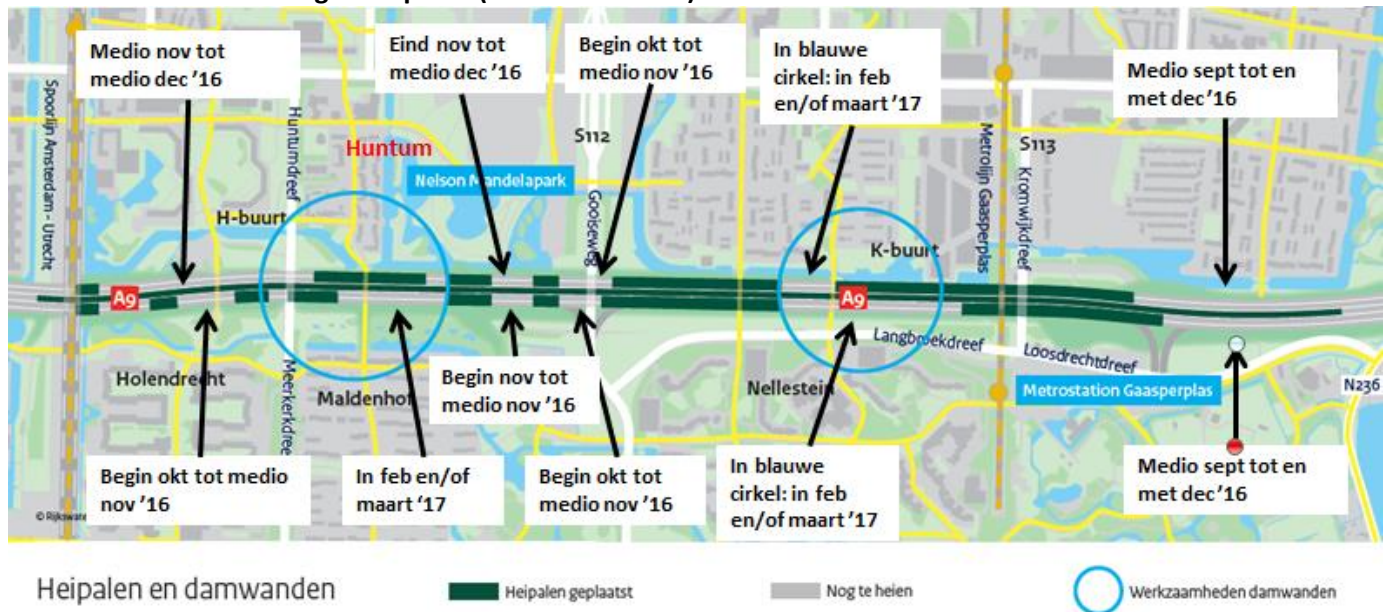


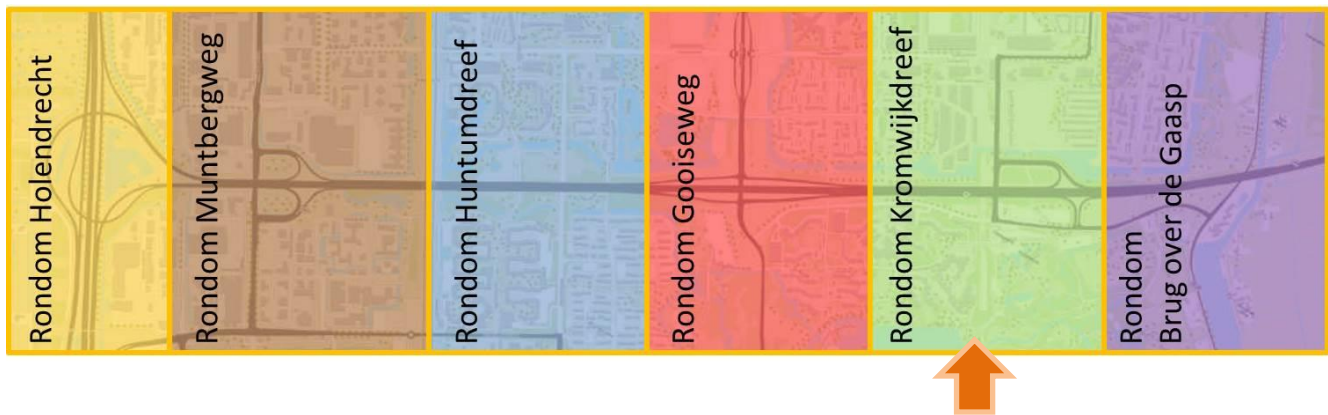


Rondon Kromwijkdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Eind juli t/m november 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Maandag 14 en dinsdag 15 november	NACHTWERK 23:00 – 02:00 uur	Asfalt frezen ter hoogte van de oprit S112 Gooiseweg en ter hoogte van de afrit S112	Geluidshinder	nvt
14 november t/m 9 december 2016	7.00 – 19.00 uur	Werkzaamheden aan en onder de hulpbrug bij het Nellesteinpad	Nellesteinpad dicht Soms geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Woensdag 16 en donderdag 17 november	NACHTWERK	Lossen speciaaltransporten ten oosten van de Kromwijkdreef	Mogelijk geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Feb en maart 2017 (precieze weken nog niet duidelijk)	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016)

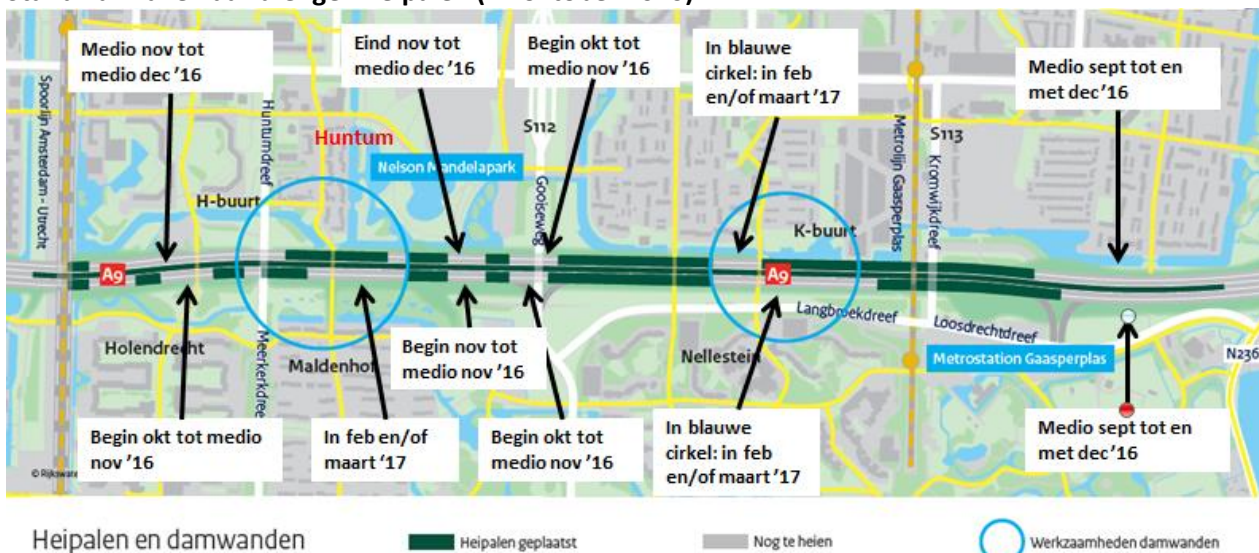


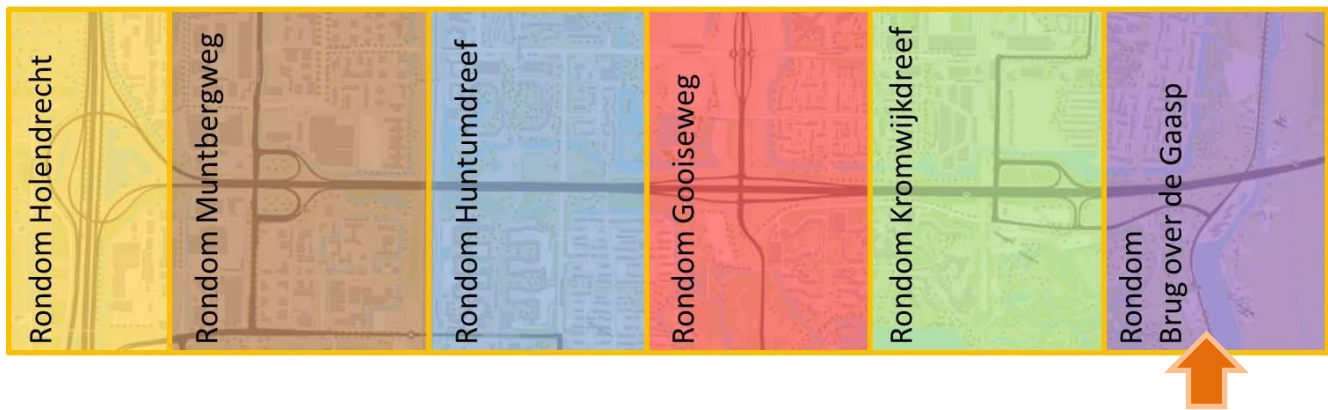

Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Eind juli t/m december 2016	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Zaterdag 5 november en zaterdag 26 november	8:00 uur tot 18:00	Heiwerkzaamheden tussen het Geerdinkhofpad en de Gaasp	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Maandag 14 november tot en met donderdag 17 november (reservedag vrijdag 18 november)	7:00 uur tot 19:00 uur	Trekken damwanden langs de Provincialeweg	<ul style="list-style-type: none"> - Geluids- en trillingshinder - Afsluiting rijbaan, verkeer wordt geleid met verkeersstops - 16/17/(18) afsluiting fietspad thv Provincialeweg 	Lees hier het bouwbericht met omleidingsroute

Stand van zaken aanbrengen heipalen (12 oktober 2016)

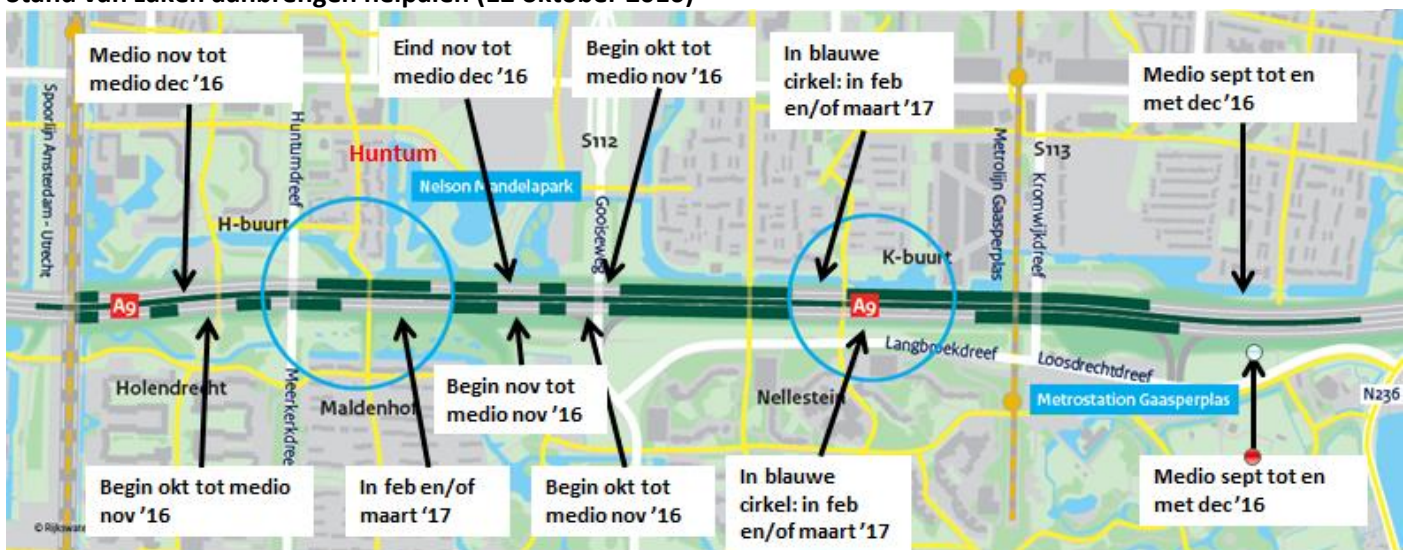

Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst

Nog te heien

Werkzaamheden damwanden
