


Tussen de spoorlijn en de Huntumdreef/Meerkerkdreef zijn alle palen aan het einde van dit jaar aangebracht. Direct naast de Huntumdreef (in het uiterst rechtse deel van de blauwe cirkel) brengen we in de eerste drie weken van maart heipalen aan. Ook komt hier nog een klein stuk damwand.

In het rechterdeel van de blauwe cirkel (waar de tunnelbuizen nog niet groen zijn) moeten we nog heipalen aanbrengen. Dit doen we van begin februari tot eind maart. We trekken hier damwanden van eind januari tot half februari. Ook moeten hier nog de laatste damwanden aangebracht worden. Dit doen we van 16 t/m 20 januari.

Tussen de twee blauwe cirkels brengen we alleen nog wat heipalen aan aan de linkerkant van de Gooiseweg. Eind januari zijn we hier klaar met heien.

In het linkerdeel van de blauwe cirkel (waar de tunnelbuizen nog niet groen zijn) moeten we nog heipalen aanbrengen. Dit doen we van 9 januari tot eind maart. We trekken hier damwanden van half januari tot eind februari.

Ter hoogte van Kouwenoord en Kantershof brengen we nog heipalen aan van 9 januari tot eind februari. Hier komt ook nog een klein stuk damwand. Dit brengen we tussen eind januari en eind maart aan.

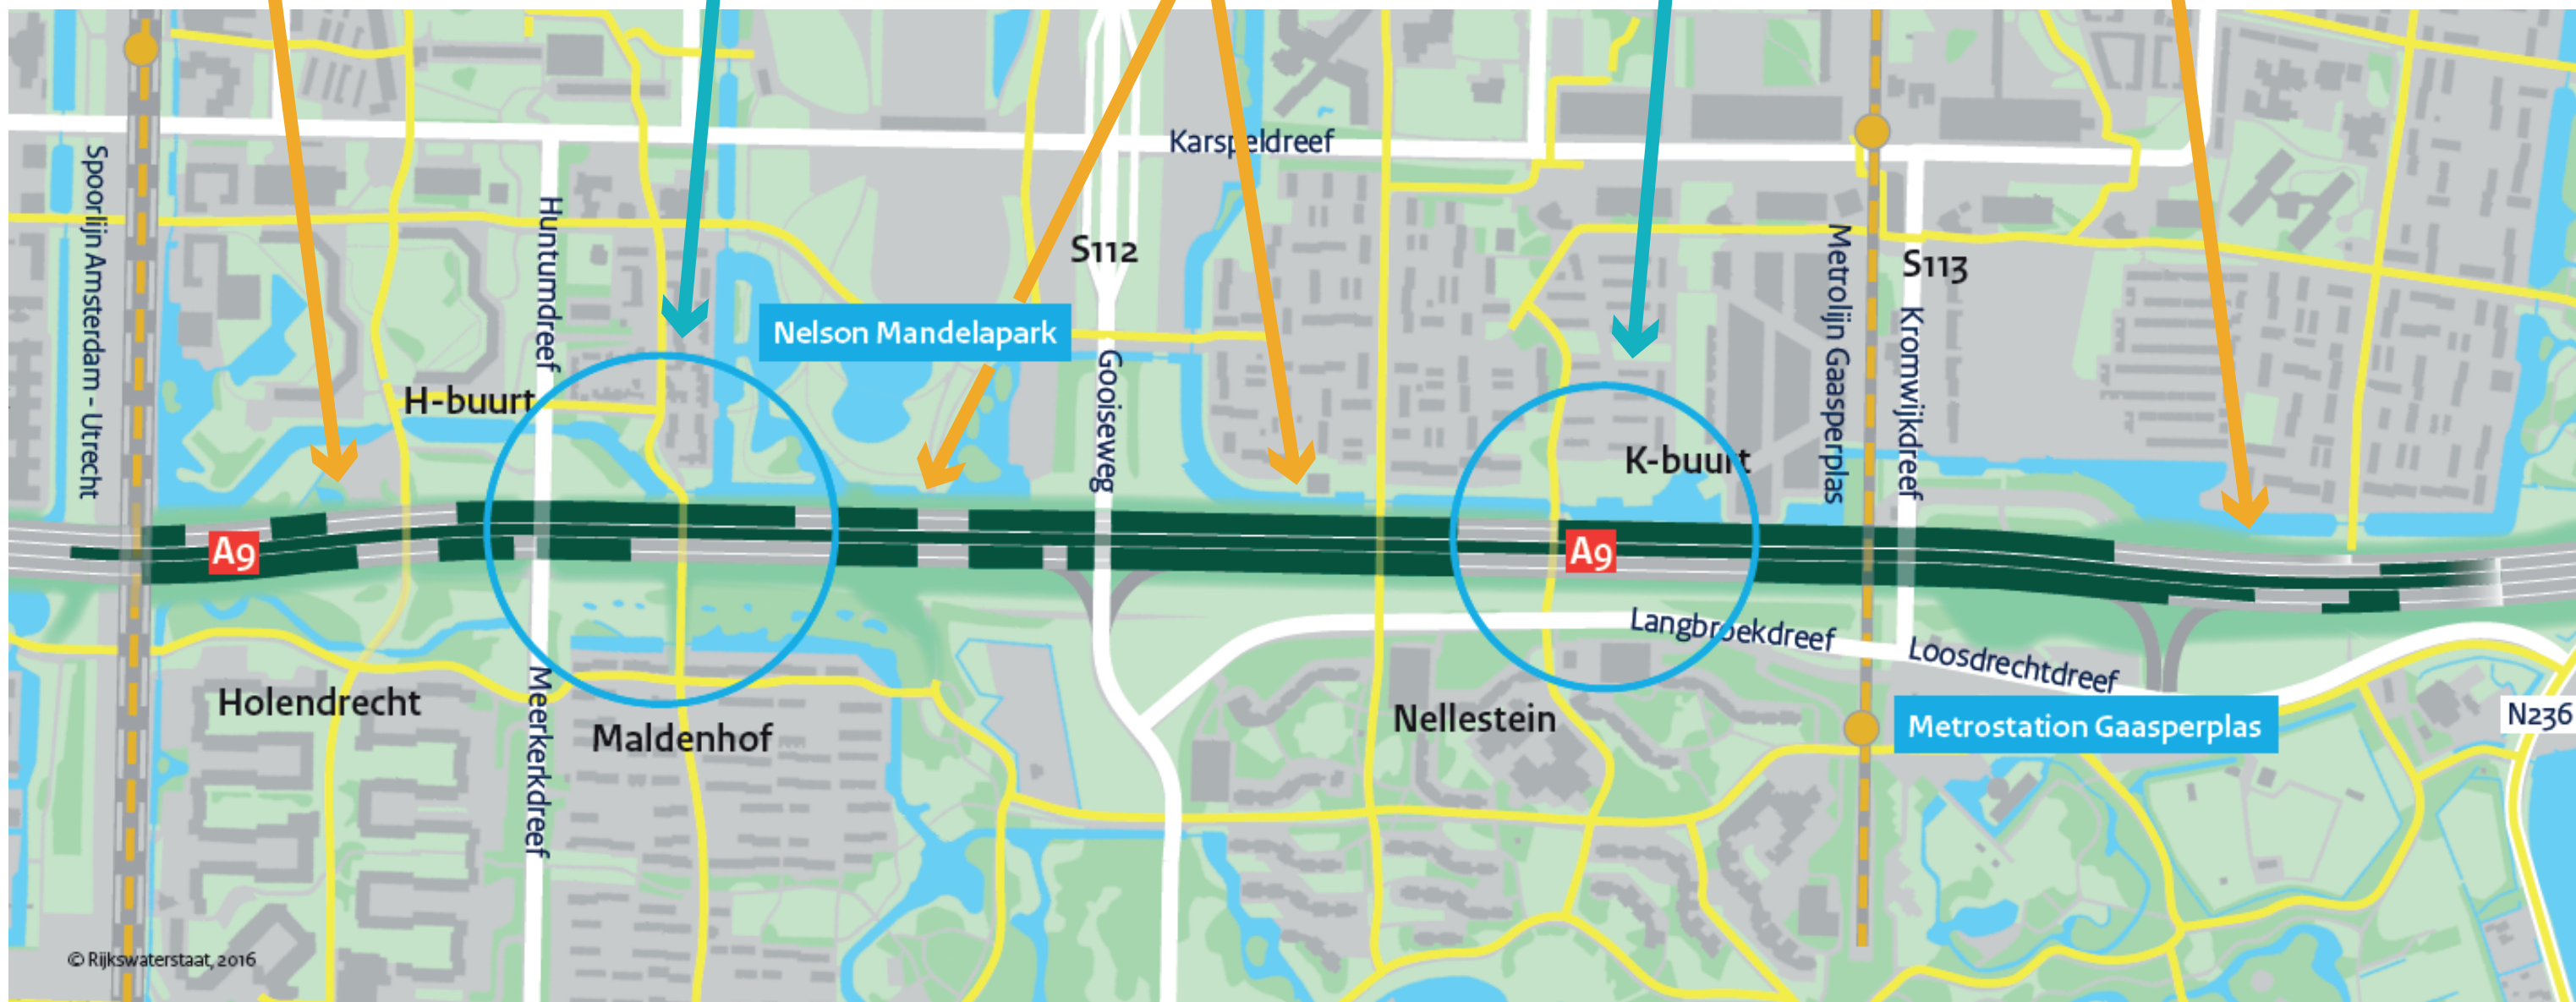

Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst

Nog te heien

Werkzaamheden damwanden

Globale planning bouw tunnel - UPDATE #2

Van juni 2016 tot in de zomer van 2017 bouwt IXAS de ruwbouw van de Gaasperdammertunnel. Daar zijn veel heipalen en damwanden voor nodig. De meeste daarvan zitten inmiddels in de grond. Op bovenstaande afbeelding ziet u waar ze wel nog moeten komen. Wilt u meer weten over de bouwstappen van de bouw van de tunnel, kijk dan op <http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl> naar de **Flyer Hoe & Wat Bouw van de tunnel**.
