


5 januari 2017

IXAS-werkschema

Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden moet de planning soms worden aangepast. Het is dan niet meer mogelijk om alle omwonenden hier persoonlijk van op de hoogte te brengen. Met dit overzicht heeft u de actuele planning altijd bij de hand. De informatie in dit werkschema is ingedeeld op woonwijk. Elke pagina beschrijft de werkzaamheden van een bepaalde wijk. In het plaatje ziet u de indeling:

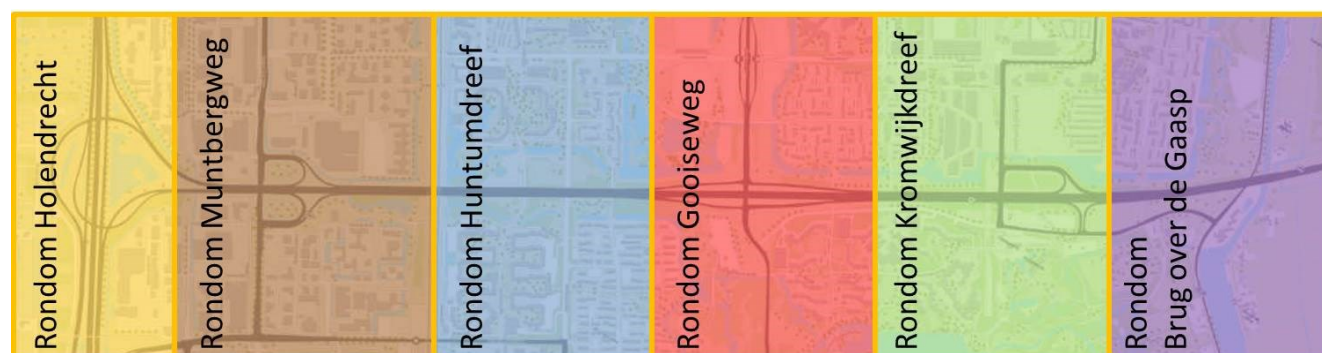

Heien op zaterdag

Nu de bouw van de tunnel gestart is, werkt IXAS dag en nacht. Funderingswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van de 8.000 heipalen voor de tunnel, doen we zoveel als mogelijk van maandag tot en met vrijdag. IXAS zal de komende periode ook op zaterdag heien. Dit gebeurt alleen bij de heistellingen die achterliggen op planning. De heistellingen die op planning liggen, staan op zaterdag stil. Om de hinder voor de omgeving te verkleinen, starten we op zaterdag om 8.00 uur in plaats van om 7.00 uur. De heiers werken door tot de achterstand ingelopen is. Ze zullen vaak in de loop van de middag klaar zijn, maar mogelijk soms ook pas om 19.00 uur.

Aanstaande zaterdag, 7 januari, zijn er geen heiwerkzaamheden




Rondom Knooppunt Holendrecht

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Donderdag 15 tot en met vrijdag 23 december DEELS UITGESTELD	Maandag – vrijdag 7:00 – 19:00 uur	Verwijderen damwanden langs verbindingsboog van A9 naar A2 richting Amsterdam	Geluids- en trillingshinder	Lees hier het bouwbericht
Maandag 9 januari en dinsdag 10 januari	22:00 – 5:00 uur	Aanbrengen 150 meter geleiderail langs A2, tussen het noordelijke en zuidelijke deel van knooppunt Holendrecht-	Geluidshinder	
Maandag 9 januari	22:00 – 5:00 uur	Plaatsen barri�r op A9 thv Muntbergweg	Geluidshinder en afsluiting verbindingsboog A2 ri Amsterdam naar A9 ri Diemen	
Donderdag 12 – donderdag 19 januari	23:00 – 5:00 uur	Nachtwerkzaamheden viaducten knooppunt Holendrecht, o.a. slopen randelementen, boren en freeswerkzaamheden	Geluidshinder	
Vrijdag 20 januari – maandag 23 januari	Weekendwerkzaamheden vrijdag 20:00 uur – maandag 5:00 uur	Inhijsen liggers nieuwe viaducten knooppunt Holendrecht, werkzaamheden aan geleiderail, frees en asfalt werkzaamheden,	Geluidshinder	



Rondom Muntbergweg


Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Maandag 18 april 2016 tot medio 2017	Gehele periode	Bouwen uitbreiding viaduct A9 over Muntbergweg	Versmalling Muntbergweg in noordelijke richting t.h.v. A9: 1 rijstrook voor rechtdoor en 1 rijstrook voor rechtsaf beschikbaar.	Lees hier het bouwbericht
Woensdag 18 januari – begin maart	Op werkdagen 7:00 – 19:00 uur	Heien steunpunten uitbreiding viaduct Lemelerbergpad	Geluidshinder	
Woensdag 25 en donderdag 26 januari	7:00 – 19:00 uur	Heien palen voor verkeersportaal aan noord- en zuidzijde A9 tussen Muntbergweg en Lemelerbergpad	Geluidshinder	

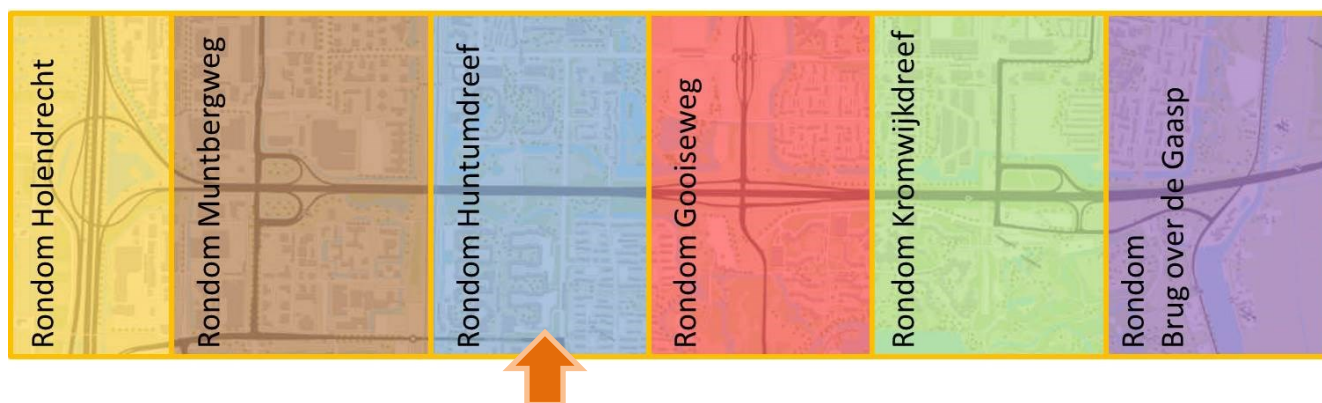

Rondon Huntumdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
Vanaf woensdag 17 augustus tot einde project	Doordeweeks 7.00 – 19.00 uur. Soms ook op zaterdag	Grondwerk voor aanleg talud en gronddepot onder toekomstige fietsbrug Nelson Mandelapark	Voetpad afgesloten	Lees hier het bouwbericht
Maandag 9 januari – maandag 13 februari	Gehele periode	Aanpassen hulpbrug Bijlmerpleinpad	Bijlmerpleinpad ter hoogte van A9 afgesloten	Meer informatie
1 februari tot eind maart 2017	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
6 februari – 17 februari	7:00 – 19:00 uur	Aanbrengen damwanden bij Bijlmerpleinpad/afrit Gooiseweg	Geluids- en trillingshinder	Lees hier het bouwbericht


Stand van zaken aanbrengen heipalen (december 2016)

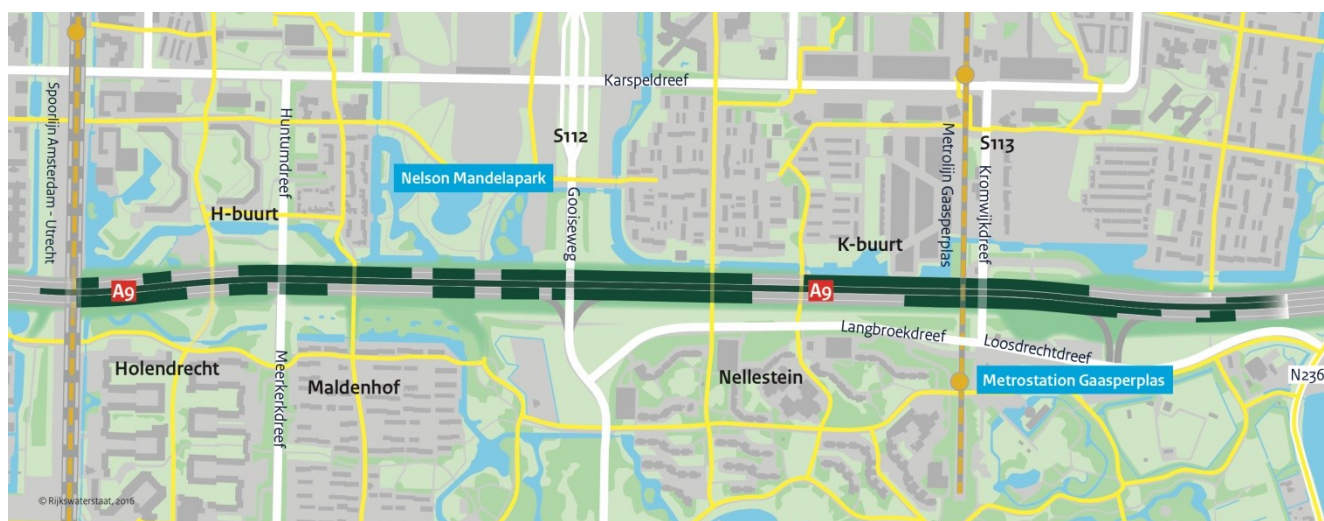

Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst


Nog te heien

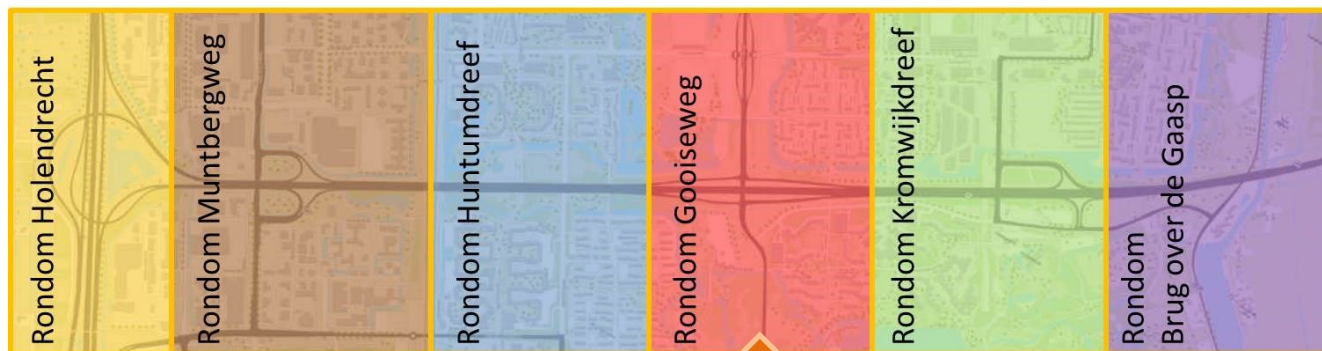

Rondon Gooiseweg

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
9 januari – eind januari	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
Tot 16 januari 2017 5:00 uur			Afrit S112 van A9 ri Utrecht/Haarlem afgesloten voor het verkeer	Meer informatie


Stand van zaken aanbrengen heipalen (december 2016)

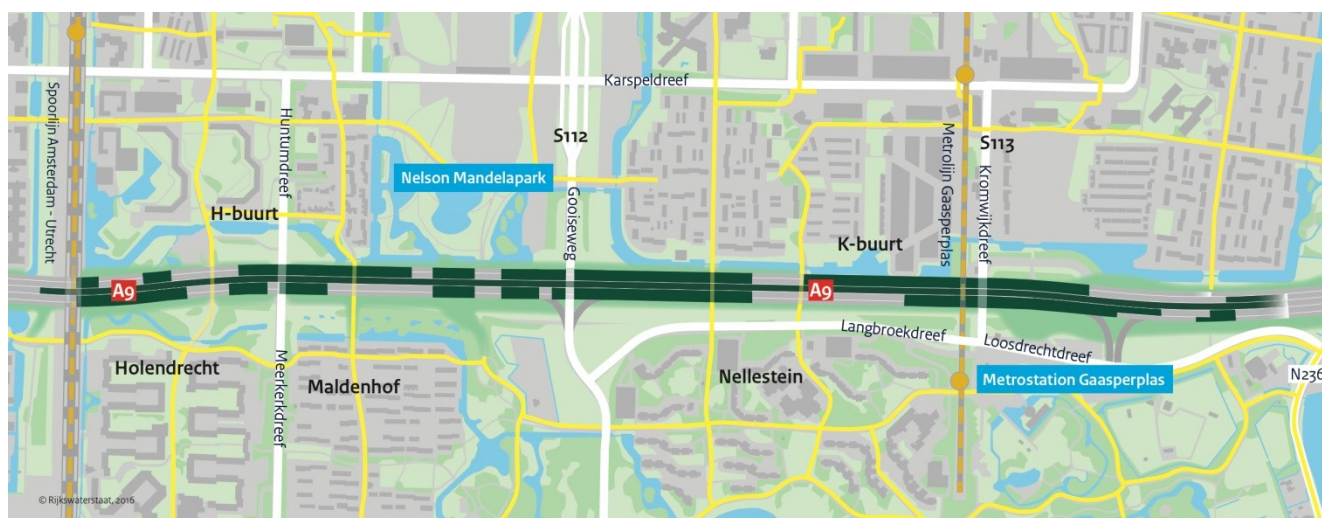

Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst


Nog te heien

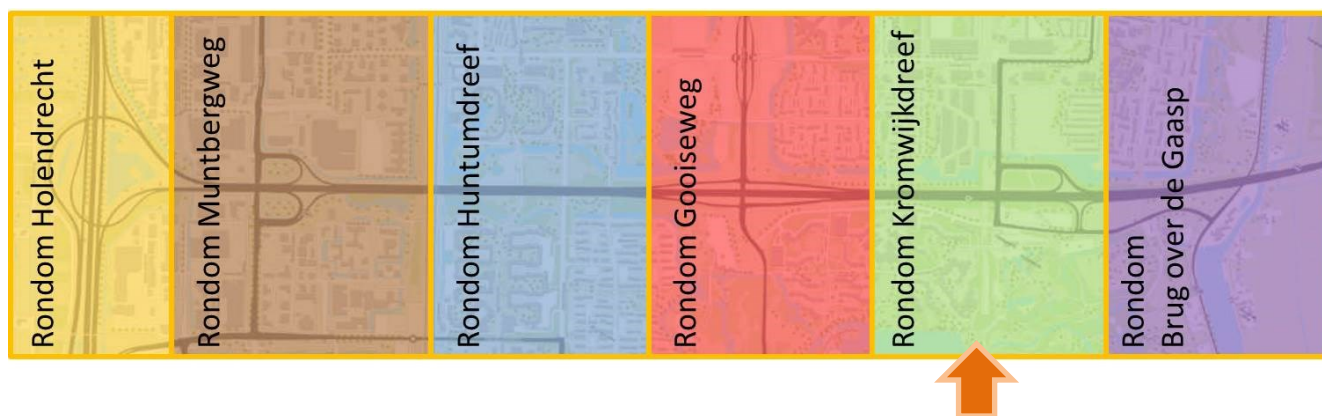

Rondon Kromwijkdreef

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
9 jan – eind maart 2017	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht
30 jan- 3 februari en 17 februari – 3 maart	7:00 – 19:00 uur	Aanbrengen damwanden rond Nellesteinpad	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (december 2016)

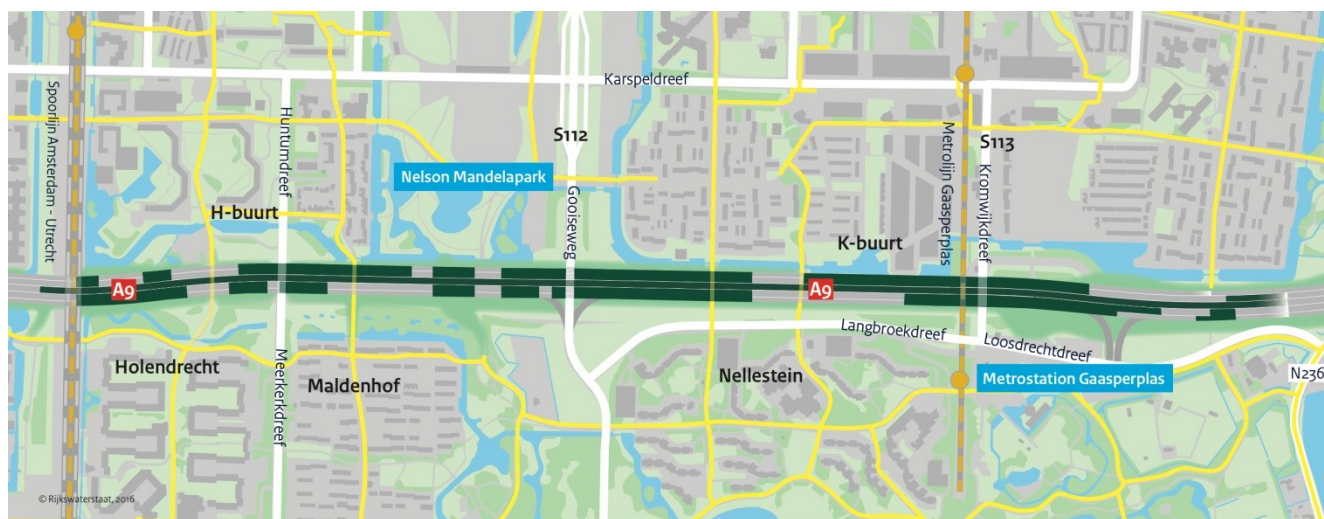

Heipalen en damwanden

Heipalen geplaatst


Nog te heien



Brug over de Gaasp

Datum	Tijd	Werkzaamheden	Hinder	Bouwbericht of omleiding
9 januari – 10 februari	7.00 – 19.00 uur	Aanbrengen heipalen voor de tunnel	Geluidshinder	Lees hier het bouwbericht

Stand van zaken aanbrengen heipalen (december 2016)

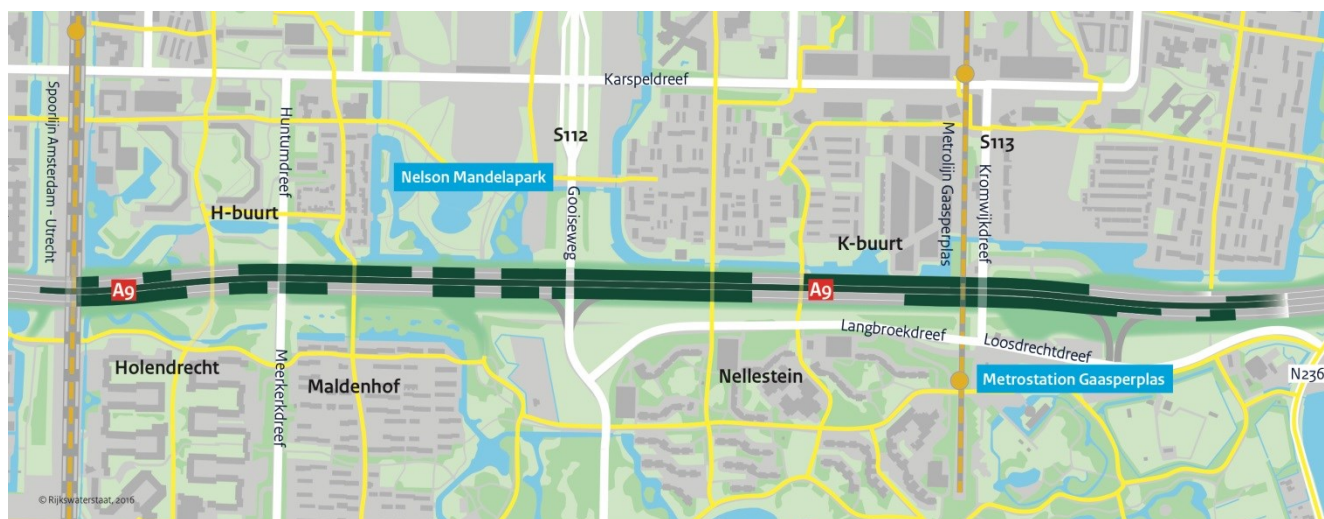

Heipalen en damwanden

■ Heipalen geplaatst

■ Nog te heien
